



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2023/SAOR/SINFRA

EXECUÇÃO FÍSICA
AGOSTO/2023 A NOVEMBRO/2024



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2023/SAOR/SINFRA

EXECUÇÃO FÍSICA – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2023/SAOR/SINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - SINFRA **ANEXO II**



				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6-projetado	7-executado	8-projetado	9-executado
2 - META / 3 - etapa	ÍTEM	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE	QTDE	QTDE		
META 1	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Etapa	1.1	Administração local					
Fase	1.1.1	Gestão das atividades: Contratação de pessoal, compra de material e o acompanhamento da execução dos serviços	cj	0,85			
META 2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Etapa	2.1	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamento					
Fase	2.1.1	Alojamento – será utilizado dependências do produtor vizinho – associado da AAGRO	cj	0,85	0,85	0,83	0,83
Etapa	2.2	Mobilização e desmobilização de pessoal					
Fase	2.2.1	01 Encarregado de Obra	cj	0,85	1,00	1,00	1,00
Etapa	2.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos rodantes					
Fase	2.3.1	01 Carro Leve - Encarregado de Obra 01 Caminhão Basculante	cj	0,85	1,00	1,00	1,00
Etapa	2.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados					
Fase	2.4.1	01 Escavadeira Hidráulica	cj	0,85	1,00	1,00	1,00
Etapa	2.6	Placa em aço - película 1 + 1 - fornecimento e implantação					
Fase	2.6.1	Instalação e desinstalação da Placa da Obra	m²	13,2855	13,29		
Etapa	2.7	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	unid	6,80	6,80		
META 3	3	OBRAS DE ARTE CORRENTES					
Etapa	3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
Fase	3.1.1	Serviços de escavação da vala para implantação do Bueiro Triplo, retirada de material podre no fundo de vala e transporte para local adequado de bota fora	m³	389,1215	389,12	457,79	457,79
Etapa	3.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório					
Fase	3.2.1	Serviços complementares e de finalização da obra, implantação do Bueiro Triplo, correspondente ao reaterro das laterais e cobertura até o nível de greide, assim como, a devida compactação mecânica.	m³	663,714	663,71	780,84	780,84

Assinado de forma digital por
LEONARDO TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27 15:00:46 -04'00'

LEONARDO

TOMCZYK:79998356172





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - SINFRA = 85,00%

ANEXO II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

PARCIAL ☐ FINAL ☒ 1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTA DE:
NOME DO EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO

11/08/2023 a 31/10/2024
18.715.101/0001-04

2 - META / 3 - etapa		4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE	NO PERÍODO			ATÉ O PERÍODO	
				6-projetado	7-executado	QTDE	8-projetado	9-executado
Etapa	3.3	Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,3	18,00		15,30	18,00
Fase	3.3.1	Elaboração de camada (lastro) de concreto para regularização da base de apoio dos módulos pre moldados, Corpo do Bueiro, fornecidos pela Sinfra, e também os serviços de lançamento, alinhamento e regularização (revestimento) do leito interno com argamassa						
Etapa	3.4	Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	unid	1,7	2,00		1,70	2,00
Fase	3.4.1	Elaboração e montagem de formas de madeira das Cabeceiras do Bueiro, a montante e jusante, assim como, o corte e montagem de ferragem, elaboração, lançamento e vibração de Concreto Estrutural e desmontagem das formas.						
Etapa	3.5	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	68,85	81,00		68,85	81,00
Fase	3.5.1	Lançamento no fundo da vala, base do corpo do bueiro, pedras de mão, formando uma camada suficiente para estabilização do leito, deverá ser devidamente espalhada e compactada						
Etapa	3.6	Remoção de tubos metálicos com diâmetro de 1,50 m (ARMCO)	m	11,05	13,00		11,05	13,00
Fase	3.6.1	Serviços preliminares de retirada do bueiro danificado existente, assim como, a limpeza e transporte dos destroços para local adequado de bota fora.						



Cuiabá, 31/10/2024

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172
Atividade de forma digital por
LEONARDO TOMCZYK:7998356172
Data: 2024.11.27 15:01:27 -48007

Leonardo Tomczyk
Diretor presidente

Associação Agrologística de Mato Grosso

DANILO
PIMENTA
BALDAN:7
200563781
Atividade de forma digital por
DANILO PIMENTA BALDAN:7200563781
Data: 2024.11.25 10:54:09-40707

Danilo Pimenta Baldan
Engenheiro - Associação
Agrologística de Mato Grosso

CREA 260.369.521-5



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2023/SAOR/SINFRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO **ANEXO III**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização

Serviço

MT – 499

BTCC de 2,50X2,450m - MT 499
Vista da Boca do Bueiro a Montante



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Vista da Boca do Bueiro a Montante




Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Vista da Boca do Bueiro a Jusante

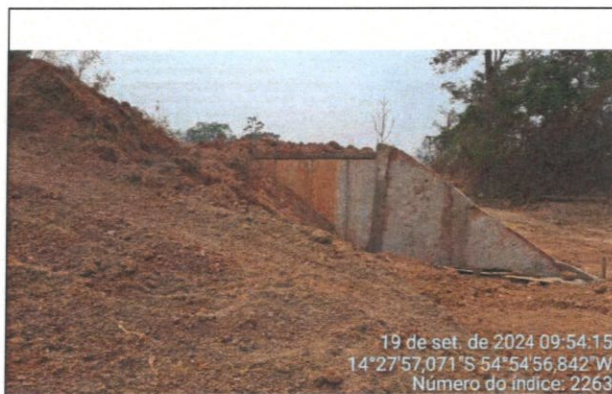

Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Vista da Boca do Bueiro a Montante

DANILO
PIMENTA
BALDAN:72
005637815

Assinado digitalmente por DANILO
PIMENTA BALDAN 72005637815
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, CN=CPFR e-CPF A1, CN=BRANCO, OU=37743132000113, OU=Identificadora, CN=DANILO PIMENTA BALDAN 72005637815
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.26 16:50:23-0400'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27
15:02:08 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499


TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024




Registro Fotográfico dos Serviços Executados

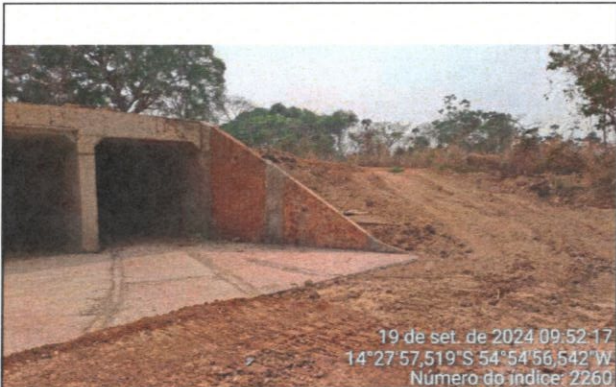


Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Vista da Boca do Bueiro a Montante



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Vista da Boca do Bueiro a Montante

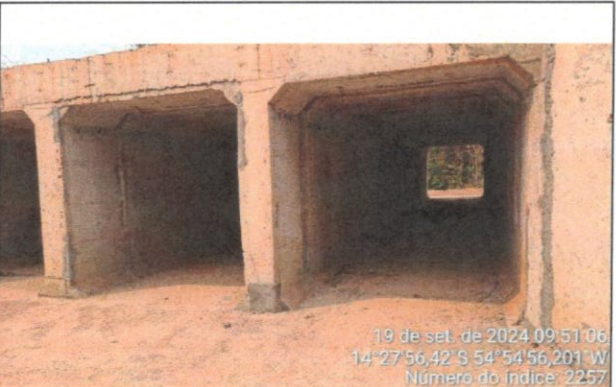

Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Vista da Boca do Bueiro a Jusante

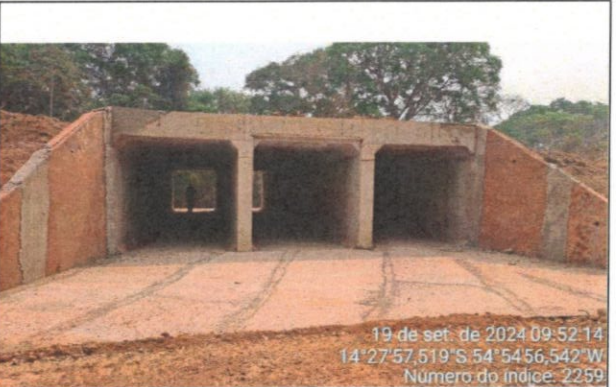

Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Vista da Boca do Bueiro a Montante

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172
Assinado de forma digital por LEONARDO TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27 15:02:37 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, limpeza e preparação da base



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, limpeza e preparação da base



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, limpeza e preparação da base



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, limpeza e preparação da base

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27
15:03:05 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, limpeza e preparação da base



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, limpeza e preparação da base



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, descarga de material de jazida.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, descarga de material de jazida.

LEONARDO
TOMCZYK:79
998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27
15:03:29 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



14,465750S 54,916022W
Bueiro MT 499

Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.



14,465672S 54,916207W
Bueiro MT 499

Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.



14,465669S 54,916052W
Bueiro MT 499

Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.



14,465668S 54,916226W
Bueiro MT 499

Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172

Assinado de forma digital
por LEONARDO
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27
15:03:52 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, espalhamento, com escavadeira
hidráulica, do material de aterro.



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de retirada do bueiro armado
instalado para desvio do leito d'água.



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de retirada do bueiro armado
instalado para desvio do leito d'água.



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:7999835617
2
Dados: 2024.11.27
15:04:15 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, espalhamento, com escavadeira
híráulica, do material de aterro.



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, espalhamento, com escavadeira
híráulica, do material de aterro.



Localização

Serviço

MT – 499

Bueiro 2,50X2,450m - MT 499
Serviços de aterro das cabeceiras do
bueiro, descarga de material de jazida.

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27
15:04:41 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, descarga de material de jazida.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, espalhamento e nivelamento, com moto niveladora, do material de aterro.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, espalhamento e nivelamento, com moto niveladora, do material de aterro.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, espalhamento e nivelamento, com moto niveladora, do material de aterro.

LEONARDO
TOMCZYK:7
9998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:7999835617
2
Dados: 2024.11.27
15:05:03 -04'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO
ANEXO III**

ASSOCIAÇÃO: AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
0003/2023/SAOR/SINFRA/2023

RODOVIA: MT - 499

TRECHO: Div. Planalto da Serra/Nova Brasilândia – Div.
Nova Brasilândia/Rosário Oeste.

PERÍODO: 11/08/2023 a 31/10/2024

DATA: 31/10/2024



Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, espalhamento e nivelamento, com moto niveladora, do material de aterro.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, descarga de material de jazida.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, descarga de material de jazida.



Localização	Serviço
MT – 499	Bueiro 2,50X2,450m - MT 499 Serviços de aterro das cabeceiras do bueiro, espalhamento e nivelamento, com moto niveladora, do material de aterro.

LEONARDO
TOMCZYK:79
998356172

Assinado de forma
digital por LEONARDO
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27
15:05:25 -04'00'

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2023/SAOR/SINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - CONTRAPARTIDA

ANEXO IV

PARCIAL ☐ FINAL ☒ 1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTA DE: 11/08/2023 a 31/10/2024
NOME DO EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO 18.715.101/0001-04

				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6-projetado	7-executado	8-projetado	9-executado
2 - META / 3 - etapa	ÍTEM	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE	QTDE	QTDE		
META	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Etapa	1.1	Administração local					
Fase	1.1.1	Gestão das atividades: Contratação de pessoal, compra de material e o acompanhamento da execução dos serviços	cj	0,15	1		
META	2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Etapa	2.1	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamento					
Fase	2.1.1	Alojamento – será utilizado dependências do produtor vizinho – associado da AAGRO	cj	0,15	0,28	0,15	0,28
Etapa	2.2	Mobilização e desmobilização de pessoal					
Fase	2.2.1	01 Encarregado de Obra	cj	0,15		0,15	
Etapa	2.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos rodantes					
Fase	2.3.1	01 Carro Leve - Encarregado de Obra 01 Caminhão Basculante	cj	0,15		0,15	
Etapa	2.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados					
Fase	2.4.1	01 Escavadeira Hidráulica	cj	0,15		0,15	
Etapa	2.6	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação					
Fase	2.6.1	Instalação e desinstalação da Placa da Obra	m²	15,63	15,63	15,63	15,63
Etapa	2.7	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	unid	8	8	8,00	8,00
META	3	OBRAS DE ARTE CORRENTES					
Etapa	3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					
Fase	3.1.1	Serviços de escavação da vala para implantação do Bueiro Triplo, retirada de material podre no fundo de vala e transporte para local adequado de bota fora	m³	68,6685		68,67	
Etapa	3.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório					
Fase	3.2.1	Serviços complementares e de finalização da obra, implantação do Bueiro Triplo, correspondente ao reaterro das laterais e cobertura até o nível de greide, assim como, a devida compactação mecânica.	m³	117,126		117,13	



Assinado de forma digital por
LEONARDO TOMCZYK:79998356172
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27 15:06:03 -04'00'

LEONARDO

Assinado de forma digital por
LEONARDO TOMCZYK:79998356172
TOMCZYK:79998356172
Dados: 2024.11.27 15:06:03 -04'00'

LEONARDO

