



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

PROCESSO nº:	SINFRA-PRO-2022/01157
INTERESSADO:	Associação Agrologística de Mato Grosso.
TERMO DE COLABORAÇÃO:	003/2020
REFERÊNCIA:	Homologação de Relatório Técnico de monitoramento

Assunto: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020, PERÍODO JULHO 2021 a OUTUBRO 2021

Introdução

O Termo de Colaboração é fruto de uma parceria da iniciativa privada, entre a Associação Agrologística de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e tem como objeto a execução da implantação e pavimentação da rodovia MT-244 – Município de Nova Brasilândia – MT, Trecho MT-244 (BR-070 – KM 40,37 ao ENTRº. MT-140) – Extensão 8,515 km, Código S.R.E: 244EMT0030, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, com fornecimento, pelas OSCS, de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, obras e/ou investimentos.

MAPA DA RODOVIA/TRECHOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO

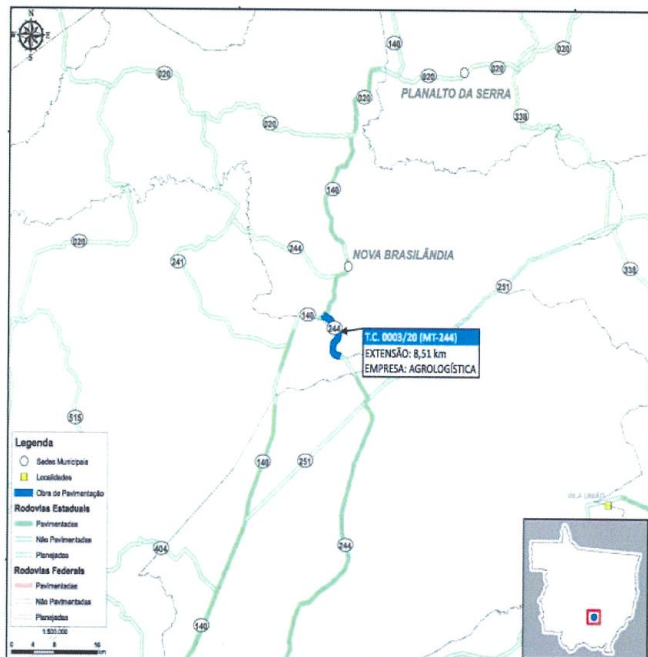


FIGURA 1 – MAPA DE SITUAÇÃO

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA-PRO-2022/01157



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística


Repasses de Recursos

Imprimir Plano de Trabalho

Concedente	Proponente	Valor:
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	ASSOCIACAO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO	9.326.548,64
Objeto		
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-244 Município de Nova Brasília-MT TRECHO: MT-244 (BR-070 KM 40,37 ao entrº. MT-140) - EXTENSÃO: 8,515 km. CÓDIGO S.R.E: 244EMT0030, conforme Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos acima, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO, PELA ASSOCIAÇÃO, DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E/OU INVESTIMENTOS.		
Período de Execução		
15/10/2020 até 29/06/2023		
Número Convênio	Nº Dossiê	Nº Banco
03/2020		104
		Nº Agência
		1496
		Conta
		35357
		Situação
		Vigente até 29/06/2023 (90 dias)
Incluir Repasse		

Nº OB	Data	Valor Concedido	Alterar	Excluir
1 251010001200055375	03/11/2020	1.500.000,00	☐	☐
2 251010001200056723	06/11/2020	500.000,00	☐	☐
3 251010001210015171	05/09/2021	4.493.466,10	☐	☐

FOTOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

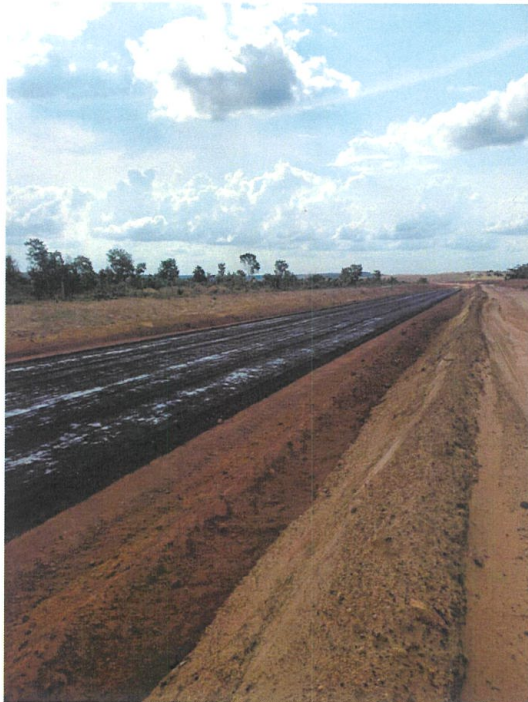

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso


mt.gov.br



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 06/04/2023 às 14:15:21.
Documento Nº: 8026310-7866 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8026310-7866>



SINFRACAP202326429

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRACAP202326429





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

[Handwritten signature]



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 06/04/2023 às 14:15:21.
Documento Nº: 8026310-7866 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8026310-7866>



SINFRACAP202326429




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Conclusão

Considerando os acompanhamentos mensais realizados pela Supervisora Astec Engenharia, responsável pelo Lote 1, onde foram emitidos relatórios das atividades desenvolvidas no período correspondente, anexados as fls.2264 a 2339, sendo eles:

- N° RTS11667121 – SETEMBRO/2021
- N° RTS11677421 – OUTUBRO/2021

De acordo com os Relatórios supracitados, foi possível evidenciar os serviços de implantação que se encontram em andamento conforme gráfico de avanço físico abaixo:

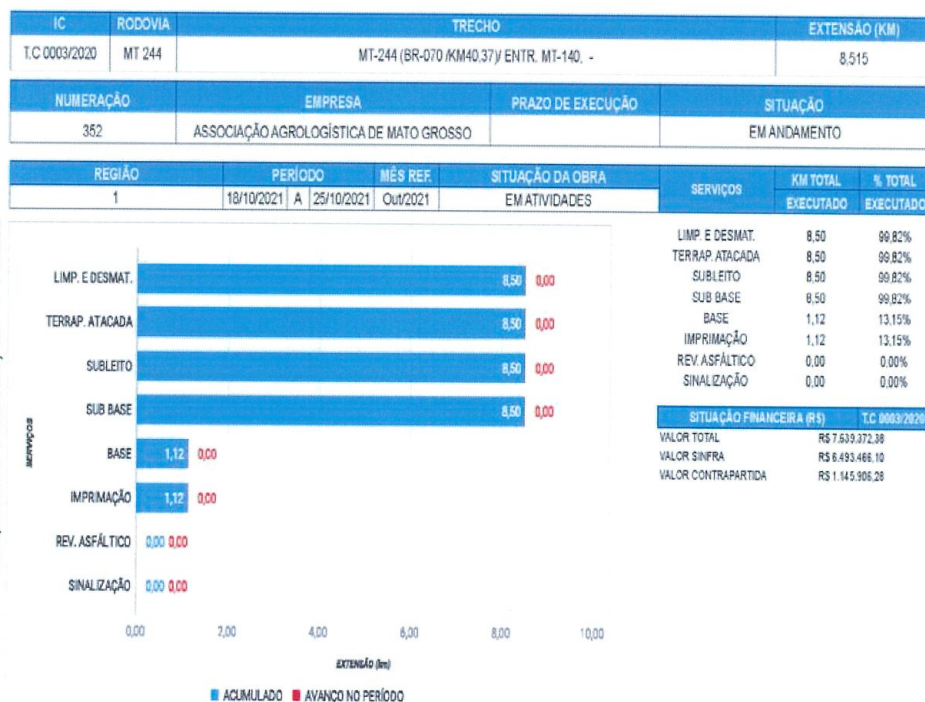

OBSERVAÇÃO DA SEMANA: EM ANDAMENTO - RITMO BOM

Considerando visita técnica "in loco" realizada pelo Fiscal Engº Wilmar Rodrigues membro da Comissão de Monitoramento durante a execução da parceria para implantação da Rodovia MT-244, no Trecho MT-244 (BR-070 – KM 40,37 ao ENTRº. MT-140) – Extensão 8,515 km, onde constatou que a obra está sendo executada dentro dos padrões de qualidade, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe de topografia e todo o controle tecnológico.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/2023/26429



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Considerando o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento, bem como o que preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019;

Tendo em vista a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no monitoramento, fiscalização a avaliação dos Termos de Colaboração e de Fomento firmados com as OSCs;

Considerando PORTARIA N° 077/2020/SALOC/SINFRA, que institui os membros da Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação das parcerias;

Sendo assim, esta Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação das parcerias constatou a viabilidade técnica, viabilidade econômica, o atendimento ao interesse público, a melhora à trafegabilidade e conclui que os serviços estão sendo executados com qualidade e dentro das normas técnicas conforme o Plano de trabalho.

Portanto, somos de **PARECER FAVORÁVEL** à continuidade aos trabalhos do Objeto firmado em Contrato e aos repasses de parcela pertinentes ao período pleiteado.

Cuiabá, 19 de maio de 2022

Atenciosamente,

ENG.ª PATRÍCIA CHAGAS LIMA
Presidente da Comissão de Monitoramento

ENG.º WILMAR RODRIGUES
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.º JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.º NILTON DE BRITTO
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA-MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 06/04/2023 às 14:15:21.
Documento Nº: 8026310-7866 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8026310-7866>



SINFRACAP202326429

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SUPAR/SAOR

Fls.: _____

Rub.: _____

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

GESTOR DE PARCERIAS:	FERNANDO DE SOUZA CAMPOS
PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2022/01157 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	Associação Agrologística de Mato Grosso
CNPJ:	18.715.101/0001-04
TERMO DE COLABORAÇÃO:	003/2020
Nº PROCESSO:	563706/2019
OBJETO DA PARCERIA:	Execução da Implantação e Pavimentação da rodovia MT-244 – Município de Nova Brasilândia-MT trecho: MT-244 (BR-070 – km 40,37 ao entrº. MT-140) - extensão: 8,515 km.
MUNICÍPIO:	Nova Brasilândia
VALOR DA PARCERIA:	R\$ 10.779.849,11
VALOR SINFRA:	R\$ 9.162.871,10
VALOR NÃO FINANCEIRO OSC:	R\$ 1.616.978,01
DATA ASSINATURA:	18/10/2020
DATA PUBLICAÇÃO:	19/10/2020
DATA VIGÊNCIA:	31/03/2021

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 167/2019 e 227/2019;

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela área técnica do objeto pactuado.

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 23/10/2023 às 16:32:17.
Documento Nº: 12579550-992 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12579550-992>



SINFRACAP202389855

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SUPAR/SAOR

Fls.: _____

Rub.: _____

III. FUNDAMENTAÇÃO

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante dos relatórios das Notas Técnicas da Execução do Objeto, elaborados pela Supervisora Astec Engenharia, sendo eles:

- N° RTS11667121 – SETEMBRO/2021
- N° RTS11677421 – OUTUBRO/2021

Somados a Nota Técnica da comissão de monitoramento e avaliação, constatou-se que a parceria está sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados, bem como acompanhamento de equipe de topografia e todo o controle tecnológico.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

Que de acordo com os relatórios da supervisora e da Nota Técnica da comissão de monitoramento, a obra está sendo executada dentro dos padrões de qualidade, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe de topografia e todo o controle tecnológico.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria está **cumprindo satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

Proporcionará conforto à população, irá melhorar as condições de limpeza na rodovia e faixa de domínio, contribuindo para a saúde pública, e proporcionar níveis satisfatórios

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 23/10/2023 às 16:32:17.
Documento N°: 12579550-992 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12579550-992>



SINFRACAP202389855

SIGA



SUPAR/SAOR

Fls.: _____

Rub.: _____

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação da rodovia MT-244. As obras contemplam também infraestruturas complementares como a implantação de sistemas de drenagem.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Ainda não foi realizada a pesquisa de satisfação, pois a obra não foi finalizada ainda. A Comissão de Monitoramento e Avaliação irá solicitar para a Associação realizar a pesquisa de satisfação sobre a obra.

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade.

F – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil ainda atualizou no site <https://www.agrologisticamt.com.br/>, as informações referentes ao Termo de Colaboração.

IV. OBSERVAÇÕES

Acompanhar e solicitar junto a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que a Associação faça a atualização das informações do Termo de Colaboração.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 23/10/2023 às 16:32:17.
Documento Nº: 12579550-992 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12579550-992>



SINFRACAP202389855

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SUPAR/SAOR

Fls.: _____

Rub.: _____

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação parcial da prestação de contas.

Cuiabá, 23 de maio 2022.

Elaborado por:

Fernando de Souza Campos
Gestor da Parceria

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 23/10/2023 às 16:32:17.
Documento Nº: 12579550-992 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12579550-992>



SINFRACAP202389855

SIGA
