

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS BUEIRO TRIPLO - BTCC MT-499

REQUISITOS BÁSICOS: T.C. Nº 003/2023/SINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDD
1	Remoção do Bueiro ARMCO existente;	Unid.	01
2	Escavação e regularização do fundo do Bueiro e Bocas;	Unid.	01
3	Remoção mecânica de material podre existente no fundo da vala;	Unid.	01
4	Execução e assentamento de Pedra Rachão para enrocamento em toda a extensão do Bueiro;	Unid.	01
5	Execução e lançamento de concreto de regularização;	Unid.	01
6	Assentamento dos módulos pré-moldados para o corpo do bueiro;	Unid.	01
7	Execução das bocas do Bueiro Duplo, elaboração de formas (forma e desforma), armaduras e, execução e lançamento de concreto	Unid.	01
8	Limpeza final e desmontagem e desmobilização do canteiro de obras;	Unid.	01

EXECUÇÃO

Será construído um Bueiro Triplo de 2,50X2,50m por 18,00m de comprimento com duas Bocas

1º FASE:

Para que o orçamento da sua empresa participe da **Cotação Prévia de Preços**, é necessário que o mesmo contenha os seguintes itens:

1. A COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS trata de:

Serviço de mão de obra para instalação de aduelas e alas para bueiro triplo da rodovia MT-499, Divisa Planalto da Serra/Nova Brasilândia Divisa Nova Brasilândia/Rosário Oeste – MT.

2. Toda a apresentação da Proposta Orçamentária deve ser em papel timbrado da empresa, constando: CNPJ, endereço da empresa, telefone, quantidade, preços unitários e total, número do orçamento e responsável pela cotação;
3. Constar a data da emissão do orçamento e o prazo de validade da proposta;
4. Dados para emissão de orçamento:

Associação Agrologística de Mato Grosso - CNPJ: 18.715.101/0001-04.

Rua Das Pérolas nº 201 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – Mato Grosso - CEP 78.050-090

Fones: (65) 3358 4268

Celular: (66) 9 9608 5499 – Marcio Lins

E-mail: cotacao5@agrologisticamt.com.br

Informações complementares:

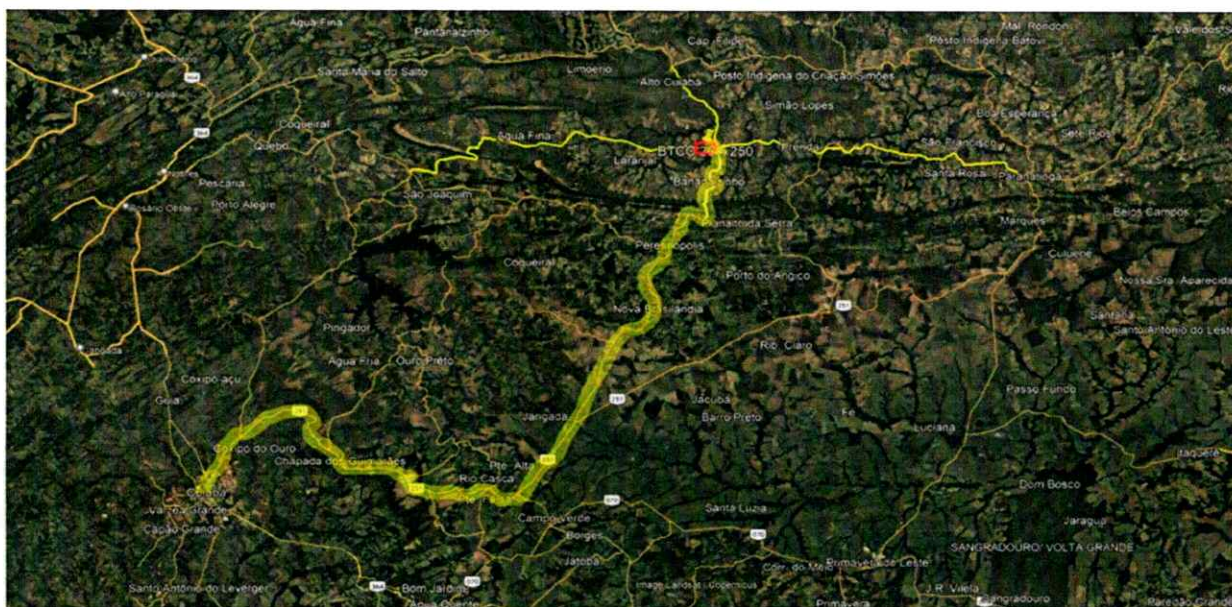
5. Forma de pagamento: após emissão da nota fiscal, pela contratada.

6. Prazo de entrega: Após autorização da ordem de serviço.


7. Local do Instalação: Rodovia MT-499, Divisa Planalto da Serra/Nova Brasilândia Divisa Nova Brasilândia/Rosário Oeste-MT. Conforme mapa em anexo.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO BUEIRO BTCC 2,50x2,50m DA MT-499


ANEXO 01



Elaborado por:


MARCIO MANOEL BENTO LINS
Depto. de Cotação Prévia de Preços - AAGRO

De acordo:


Eng. DANILO PIMENTA BALDAN
Responsável Técnico - AAGRO
Registro Nacional nº 260369521-5


Adm. MILTON FERREIRA JÚNIOR
Gestor Administrativo – AAGRO
